



Vorstellung UIA-Projekt home and care

Fachveranstaltung EU-Förderung für innovative
Stadtentwicklung – Regionalverband Ruhr
Digital per Zoom, 19.04.2023





UIA-Projekt home and care



Kurzbeschreibung

Projektziele	<ul style="list-style-type: none">• Armutsrisiko für Alleinerziehende und ihre Kinder reduzieren• Fachkräftemangel in der Pflege und Erziehung begegnen• Kinderbetreuung flexibilisieren• Pädagogische Weiter- und Ausbildungen auf Bedarfe Alleinerziehender anpassen
Grundidee	Ein innovatives Wohn-, Betreuungs-, Arbeits- und Ausbildungskonzept für Alleinerziehende und deren Kinder umsetzen, das Vollzeitbeschäftigung sichert und berufliche Qualifizierung ermöglicht (ohne das Kindeswohl zu gefährden).
Lösung	Die Großtagespflegen und die Tür-an-Tür Wohngemeinschaften in einem Gebäude ermöglichen eine neue Form der flexiblen Kinderbetreuung.



UIA-Projekt home and care



Zahlen, Daten, Fakten

EU-Fonds / Förderprogramm	EFRE – UIA	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung – Urban Innovative Actions
Förderhöhe	EUR 4,983 Millionen	Gesamtkosten EUR 6,229 Millionen (gestiegen auf knapp 8 Millionen)
Laufzeit	09/2019 – 07/2023	Ursprünglich bis 08/2022 (2021 wurde Verlängerung beantragt)



home and care

UIA-Projekt home and care



Stadt
Landshut



Projektpartner

Projektpartner (acht lokale Partner)	Stadt Landshut Hochschule für Angewandte Wissenschaften Landshut Fachakademie für Sozialpädagogik der Schulstiftung Seligenthal ZAK e.V. Landshut ZAK-Kinderstiftung "Zukunft für alle Kinder" Heilig-Geistspitalstiftung Landshut Klinikum Landshut LAKUMED Kliniken
Weitere Stakeholder	Jobcenter Landshut Bildungsregion Landshut Gesundheitsregion ^{PLUS} Landshut
Internet	https://www.homeandcare.eu/



UIA-Projekt home and care



Meilensteine

Juli 2020

- Planung der Gebäude ist abgeschlossen
- Baugenehmigung liegt vor
- Ausschreibung für Bauarbeiten beginnt

Sept. 2020

- Fertigstellung des Ausbildungskonzepts für Alleinerziehende zu qualifiziertem pädagogischen Fachpersonal

Juli 2021

- Aufstellen der Bautafel
- Baubeginn mit offiziellem Spatenstich am 13.07.2021

Juni 2022

- Bauphase der Gebäude ist abgeschlossen
- Umsetzung und Erprobung des Wohn- und Betreuungskonzepts des Projekts beginnt
- Unterzeichnung der Mietverträge



home and care

UIA-Projekt home and care



Meilensteine

Juli 2022

- Einzug der Bewohnerinnen und Inbetriebnahme der Großtagespflegen

Juni 2023

- Präsentation der gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse der Forschung seitens der Hochschule
- Präsentation „Policy Paper“ seitens der Hochschule Landshut

Juli 2023

- Abschluss der Ausbildung
- Übergabe der Zeugnisse



Wohnen und Arbeiten




Gebäudekomplex






Projektidee





Projektidee

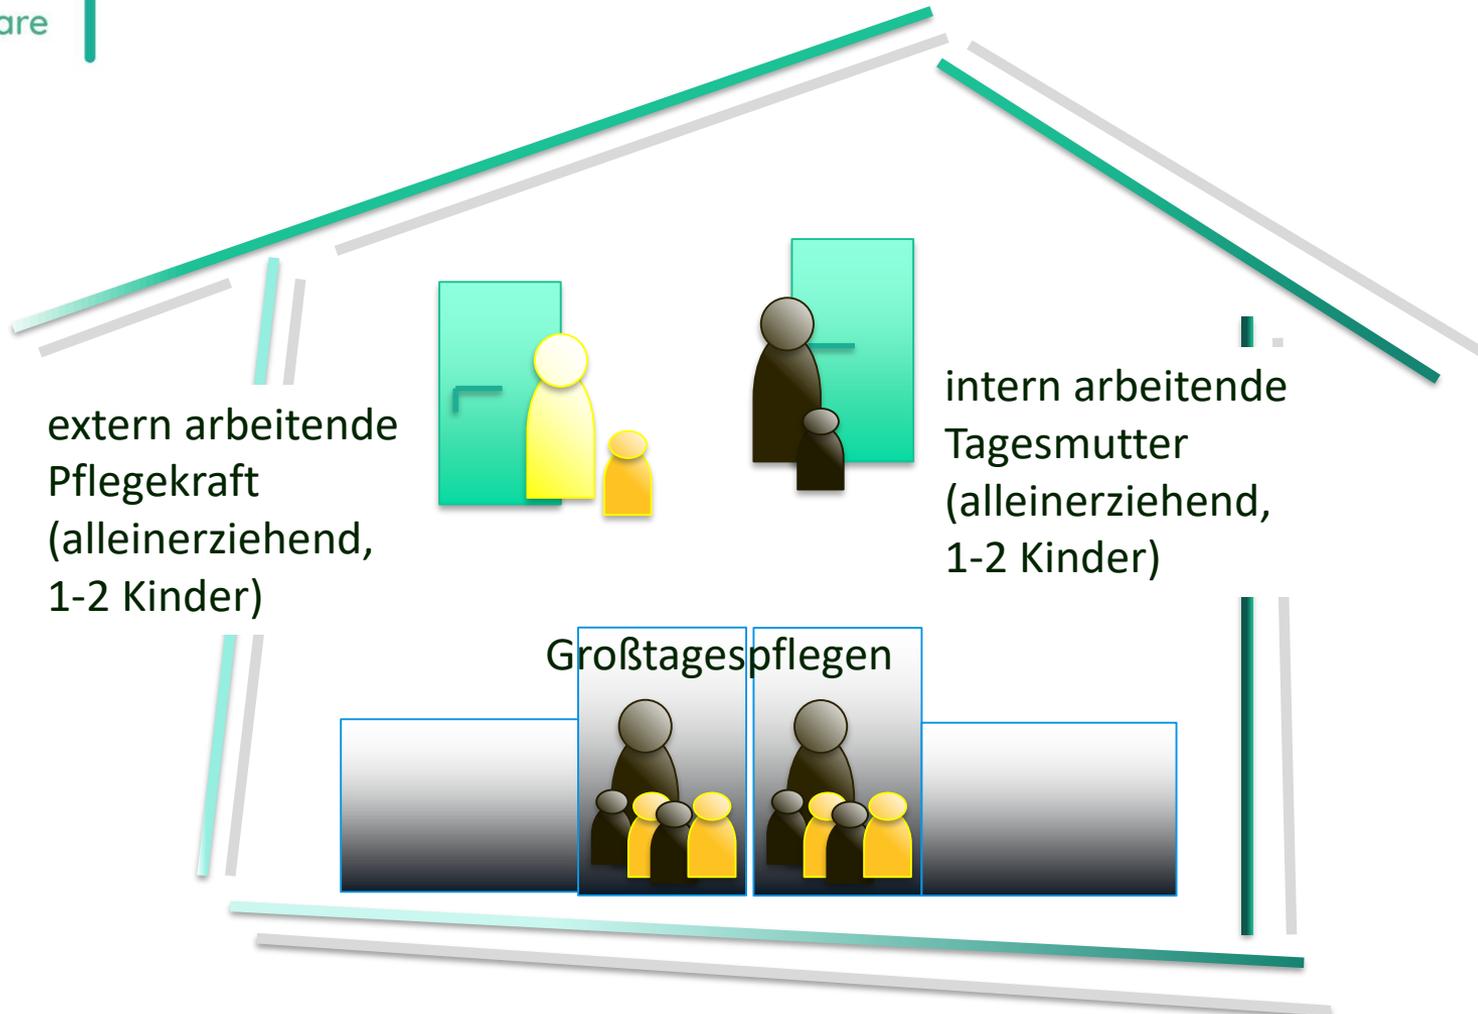

Herausforderungen und Lösungsansätze

Akquise

- Rahmenbedingungen standen lange nicht fest
- Hohe Fluktuation wegen Projektverlängerung
- Langwieriger Matchingprozess
- Verstärkte Werbeaktivitäten > Soziale Medien & Ebay

Bauzeit und Kosten

- Erhöhte Baukosten im Zuge der Corona-Pandemie und Ukraine Krise
- Ausschreibung für Generalunternehmer brachte nur über dem Budget liegende Angebote ein
- Verlängerungsantrag musste gestellt werden

Ausbildung

- Reform der Erzieherausbildung 2021
- Nicht-Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen
- Ausweitung und Überarbeitung des Ausbildungskonzepts
